




Anwohnerinformation zu **Bauarbeiten** südlich des Engasserbogens

am 20.4.2018

**9 von 14 Hilfsbrücken sind bereits geschafft!
Die vorletzte Einbausequenz folgt ab dem 23. April.**

Der Einbau der Hilfsbrücken unter den Gleisen nähert sich seinem Ende. Nächsten Montag starten die Arbeiten für die nächsten drei Hilfsbrücken, die wieder die ganze Woche über andauern werden:

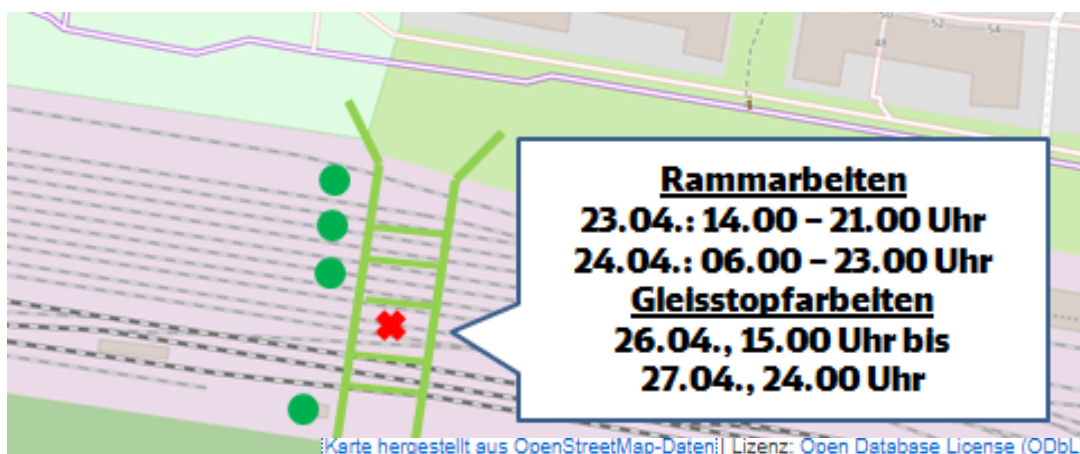

Die lärmintensiven Rammarbeiten finden nächste Woche voraussichtlich am Montag, 23.04.18 zwischen 14.00 – 24.00 Uhr und am Dienstag, 24.04.18 ab 06.00 Uhr den ganzen Tag über statt. In der Nacht zum Mittwoch wird durchgehend Aushub getätigt. Die Piepgeräusche durch rückwärts fahrende Baufahrzeuge können leider nicht vermieden werden.

In der ersten Mai-Woche werden keine Hilfsbrücken eingebaut. **Der letzte Einbauzyklus startet über das Wochenende am 05. Mai 2018.** Mitte Mai ist die Baustraßenunterführung südlich des Engasserbogens fertig.



Internet
E-Mail
Telefon
Instagram

www.2.stammstrecke-muenchen.de mit Anwohner-Newsletter
2SBSS@deutschebahn.com
089 1308-22991
2_stammstrecke **Twitter** @2_stammstrecke
